

5 서부광역철도 조기 건립 추진
(조정전) 서부광역철도 조기 착공

총괄부서	교통행정과장:남중운 ☎3153-9610 팀장:권봉성 ☎9641 담당:백선정 ☎9643				
중앙정부 도움필요	□제도 ■재정 ■권한	추진구분	□신규 ■계속	완료구분	■임기내 □임기후
재원	■국비 ■시비 □구비 □기타	건설비	21,526억원	추진현황	완료
사업주체	국토교통부	집행액	(해당없음)-	추진율	100%

사업목적(목표)

- 서부지역 철도 서비스 취약지역에 대한 광역교통망을 구축하여 한강 횡단 철도의 지역적 불균형을 해소하고자 서부광역철도 조기건립을 위한 지자체 단위의 적극적인 지원

사업개요

- 사업기간 : 2017. ~ 2025년(제3차 국가철도망구축 기간)
- 사업내용
 - 구간 : 부천대장 ~ 화곡 ~ 홍대입구
 - 규모 : 총연장 18km(마포구간 : 7.9km), 정거장 11개소
 - 차량종류 : 중형전철(4량 1편성)
 - 건설비 : 21,526억원(국비50%, 시비50%)
 - 계획수립 및 승인 기관 : 국토교통부 (철도투자개발과)

공약조정

- 조정사항 : 공약사업 명칭 및 방안지표 변경
- 조 정 일 : 2021.12.13.
- 조정사유 : 국가 추진사업으로 사업확정(국가철도망 고시) 후 국토교통부에서 사업 추진 여부 자체가 결정되지 않아 착공 일정이 현실적으로 미정임
 - 따라서, 서부광역철도의 신속한 건립을 위한 우리구 공무원과 주민들의 적극적인 노력의 과정을 측정 가능하게 개량화하여 조정

추진계획

○ 연차별 추진일정

세부추진사항	2018				2019				2020				2021				2022.6.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
서부광역철도 조기 건립 추진																				

(조정전) 세부추진사항

세부추진사항	2018				2019				2020				2021				2022.6.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
서부광역철도 조기 착공																				

○ 공약달성 확인 지표

확인지표	비중 (%)	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022.6.
				100%	65%	80%	90%	95%
서부 광역철도 추진위원회 운영 (위원회 4회이상 개최)	25	회	5	2	2			1
서부 광역철도 건설추진 TF팀 구성	25	팀	1	1				
주민설명회 개최	25	회	4	4				
유관기관 협약 및 협의(상시)	25	식	5		2	2		1

(조정전) 공약달성 확인지표

확인지표	비중 (%)	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022.6.
				100%	-	-	-	100%
사업추진방법결정 (재정사업 또는 민자)	100	식					1	

○ 연차별 투자수요 : 비예산

추진실적

○ 연차별 추진실적

확인지표	비중 (%)	추진율 (%)	단위	목표	추진실적						
					소계	2018	2019	2020	2021	2022.4.	
총 추진율					100%	100%	65%	80%	90%	90%	100%
서부 광역철도 추진위원회 운영 (위원회 4회이상 개최)	25	90	회	5	5	2	2	0	0	1	
서부 광역철도 건설추진 TF팀 구성	25	100	팀	1	1	1	0	0	0	0	
주민설명회 개최	25	100	회	4	4	4	0	0	0	0	
유관기관 협약 및 협의(상시)	25	90	식	5	5	0	2	2	0	1	


세부추진내용

○ 일정별 추진실적

일 자	세부내용
2016.06.17.	제3차 국가철도망 구축계획 확정고시
2016.07.14.	서부지역 광역철도 건설추진 TF팀 구성(마포구)
2016.09.08.	서부지역 광역철도 건설사업 지원조례 제정
2016.12.20.	서부지역 광역철도 건설사업 추진위원회 구성
2017.04.07.	광역철도 신정차고지 타당성용역결과 서울시 대책회의
2017.06.22.	서부지역 광역철도 건설사업 추진위원회 간담회(2차)
2017.07.05.	관계 지자체 국회의원 보좌관 국토교통부 및 서울시 관계자 면담
2017.10.18.	타당성 조사 용역비 서울시 2018년도 예산 반영 요청
2018.02.28.	사업관계기관 실무 TF팀 구성(서울시,경기도,마포,강서,양천,부천)
2018.04.26.	신정차량기지 이전 및 활용방안 타당성조사용역 착수(서울시)
2018.07.27.	원종~인천청라 연장에 대한 타당성용역 건에 대한 협의(서울시, 인천시)
2018.09~10월	광역철도 진행사항 주민설명회 개최(서교동,성산1동,성산2동,상암동)
2019.01.30	서울특별시의회 서부지역광역철도 건설 특별위원회 개최
2019.03.05	원종 ~ 홍대선 차량기지관련 관계기관 회의(서울, 경기, 인천 등 관계기관)
2019.06.25	서부지역 광역철도 건설사업 추진위원회 정기회의 개최
2019.12.06	서부광역철도 차량기지 확보 및 신정차량기지 이전 타당성 조사 용역 완료

일 자	세부내용
2019.12.18	서부광역철도 관련기관 회의
2020. 02월	에비타당성 조사 의뢰(서울시 → 국토교통부)
2020.11.30	현대건설에서 민자사업 제안서에 대한 사전협의
2020.12.15	국토교통부 민간투자사업 제안에 대한 의견 조희
2021.2.~ 2022.2.	국토교통부에서 KDI(한국개발연구원)으로 민자 적격성 조사
2022.04.07	대장홍대선 복선전철 민간투자사업 전략환경영향평가 주민설명회

노선계획(안)

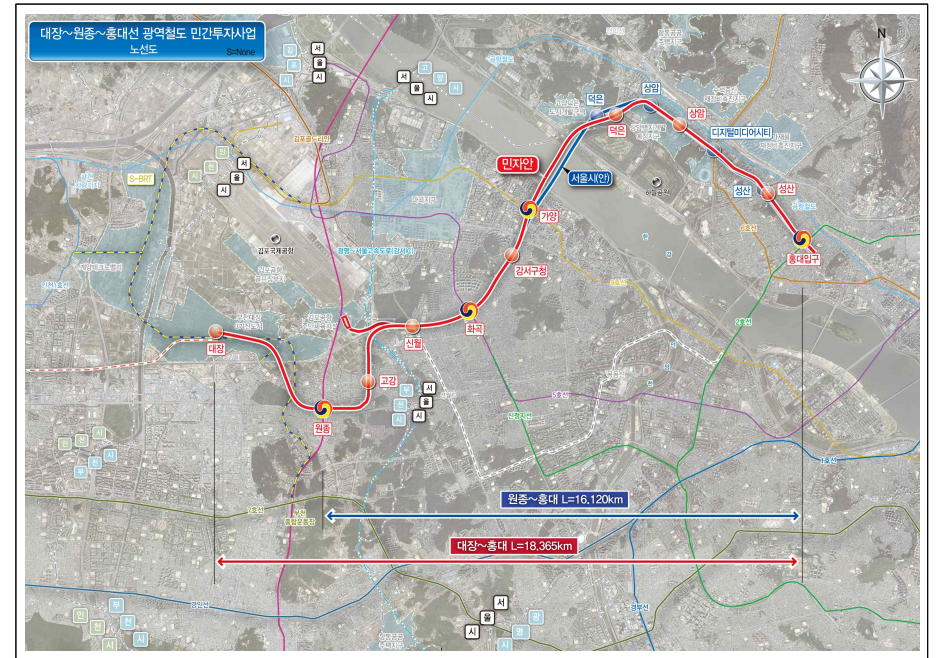

주) 파란색은 서울시 계획노선, 빨간색은 민자사업시행시 제안노선

향후계획

- 2024년 상반기 착공예정
- 적극 홍보를 통해 우리구에 효율적인 정거장 설치가 되도록 참여 도모
